
Project1

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**1000 Analiza și Planificarea inițială**	**20 days**	**Wed 10/1/25**	**Tue 10/28/25**		**Ciobanu Rareș**
2		1100 Analiza proceselor interne actuale	1 wk	Wed 10/1/25	Tue 10/7/25		Ciobanu Rareș
3		1200 Definirea fluxurilor dorite	1 wk	Wed 10/8/25	Tue 10/14/25	2	Ciobanu Rareș
4		1300 Elaborarea specificațiilor tehnice	1 wk	Wed 10/15/25	Tue 10/21/25	3	Ciobanu Rareș
5		1400 Redactarea și aprobarea Caietului de Sarcini	1 wk	Wed 10/22/25	Tue 10/28/25	4	Ciobanu Rareș
6		J1: Analiza tehnică finalizată	0 days	Tue 10/28/25	Tue 10/28/25	5	Ciobanu Rareș
7		**2000 Achiziția serviciilor de dezvoltare**	**20 days**	**Wed 10/29/25**	**Tue 11/25/25**	6	**Lupu Raluca**
8		2100 Prospectarea pieței și identificarea potențialilor furnizori	1 wk	Wed 10/29/25	Tue 11/4/25	6	Lupu Raluca
9		2200 Transmiterea Cererilor de Ofertă și a Caietului de Sarcini	1 wk	Wed 11/5/25	Tue 11/11/25	8	Lupu Raluca
10		2300 Evaluarea ofertelor	1 wk	Wed 11/12/25	Tue 11/18/25	9	Lupu Raluca
11		2400 Negocierea clauzelor și semnarea contractului de prestări servic	1 wk	Wed 11/19/25	Tue 11/25/25	10	Lupu Raluca
12		J2: Contract software semnat	0 days	Tue 11/25/25	Tue 11/25/25	11	Lupu Raluca
13		**3000 Dezvoltarea și Integrarea Platformei**	**40 days**	**Wed 11/26/25**	**Tue 1/20/26**	12	**Păun Marius**
14		3100 Configurarea serverelor și a mediului de dezvoltare	2 wks	Wed 11/26/25	Tue 12/9/25	12	Păun Marius
15		3200 Dezvoltarea conectorului API	4 wks	Wed 12/10/25	Tue 1/6/26	14	Păun Marius
16		3300 Implementarea design-ului și a funcționalităților de bază	4 wks	Wed 11/26/25	Tue 12/23/25	14SS	Păun Marius
17		3400 Testarea funcțională și testarea de securitate	2 wks	Wed 1/7/26	Tue 1/20/26	16,15	Păun Marius
18		J3: Platforma recepționată	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	17	Păun Marius
19		**4000 Gestionarea Conținutului**	**40 days**	**Wed 11/26/25**	**Tue 1/20/26**	12	**Ciobanu Rareș**
20		4100 Colectarea specificațiilor tehnice și a fotografiiloR	6 wks	Wed 11/26/25	Tue 1/6/26	12	Ciobanu Rareș
21		4200 Prelucrarea și standardizarea imaginilor de produs	1 wk	Wed 1/7/26	Tue 1/13/26	20	Ciobanu Rareș
22		4300 Importul datelor în platformă și verificarea afișării corecte	1 wk	Wed 1/14/26	Tue 1/20/26	21,16	Ciobanu Rareș
23		J4: Baza de date populată	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	22	Ciobanu Rareș
24		**5000 Managementul Resurselor Umane și Instruire**	**15 days**	**Wed 1/21/26**	**Tue 2/10/26**	18	**Lupu Raluca**
25		5100 Elaborarea materialelor de training	1 wk	Wed 1/21/26	Tue 1/27/26	18	Lupu Raluca
26		5200 Organizarea și susținerea sesiunilor de training cu Key Users	1 wk	Wed 1/28/26	Tue 2/3/26	25	Lupu Raluca
27		5300 Evaluarea cunoștințelor dobândite	1 wk	Wed 2/4/26	Tue 2/10/26	26	Lupu Raluca
28		J5: Personal instruit	0 days	Tue 2/10/26	Tue 2/10/26	27	Lupu Raluca
29		6000 Lansare și Monitorizare Proiect	1 day	Thu 2/19/26	Thu 2/19/26	2SS,34	Păun Marius
30		6100 Monitorizarea progresului și controlul calității	24 wks	Wed 10/1/25	Tue 3/17/26		Păun Marius
31		6200 Campanie de marketing pentru lansare	2 wks	Wed 1/21/26	Tue 2/3/26	18	Păun Marius
32		6300 Go-Live și monitorizarea performanței	1 day	Wed 2/11/26	Wed 2/11/26	23,28	Păun Marius
33		6400 Întocmirea rapoartelor finale și închiderea financiară	1 wk	Thu 2/12/26	Wed 2/18/26	32	Păun Marius
34		J6: Proiect închis	0 days	Wed 2/18/26	Wed 2/18/26	33	Păun Marius

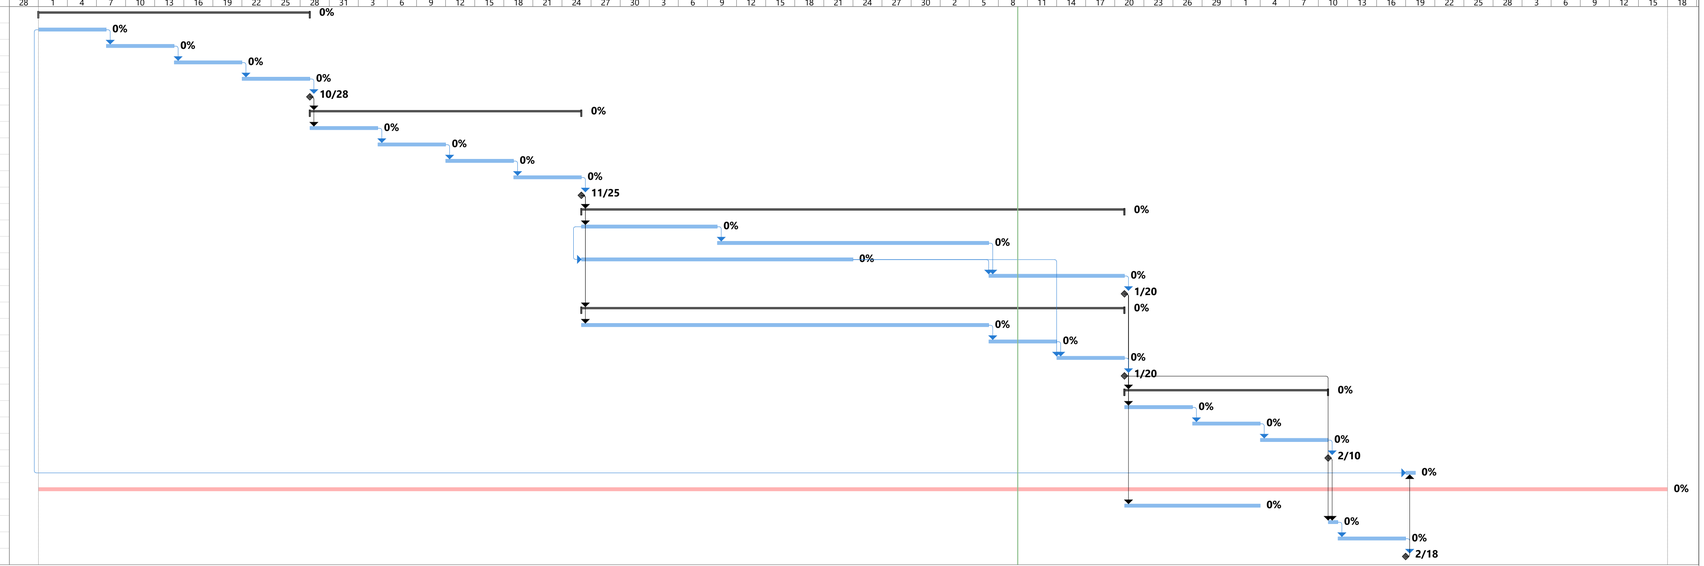

Critical · Critical Progress · Split · Manual Task · Finish-only · Baseline · Baseline Milestone · Summary Progress · Manual Summary · External Tasks · Inactive Task · Inactive Summary
Critical Split · Task · Task Progress · Start-only · Duration-only · Baseline Split · Milestone · Summary · Project Summary · External Milestone · Inactive Milestone · Deadline
